

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 13 **del mese di** Giugno
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI CUI ALLE DELIBERE N. 2343/2000, N. 3078/2001, N. 996/2002, N. 2283/2002, N. 1387/2003, N. 1661/2004, N. 1533/2005, N. 2246/2005, N. 1185/2006, N. 747/2007, N. 1661/2008 E N. 2285/2010. NUOVI TERMINI PER L'AVVIO E LA ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MODIFICA TIPOLOGICA DI ALCUNE STRUTTURE E REVOCHE.

Cod.documento GPG/2011/809

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/809

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge 24 febbraio 1992 n° 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- la legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la legge regionale 21 aprile 1999 n° 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e in particolare:
 - i commi 4 e 5 dell' art. 4, che così recitano:
 - "4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001."
 - "5. La Regione favorisce ed incentiva:
 - a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
 - b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare

centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.”

- l'art. 5, comma 2, che così recita:

“2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

- [...] all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);”

- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 2008;
- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n° 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";
- la propria deliberazione n° 1166 del 21 giugno 2004 "Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee

guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;
- il "Manuale per la gestione dell'attività tecnica dei COM" redatto dal "Servizio Sismico Nazionale”;
- il documento "Modello integrato per le principali aree sismogenetiche" redatto dal Dipartimento della protezione civile;
- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;
- le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008 e n. 2285/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile;

Dato atto che la Giunta Regionale, ha approvato i citati programmi di finanziamento a favore degli Enti Locali per il potenziamento del Sistema regionale di protezione civile ed in particolare per la realizzazione di centri unificati provinciali, centri sovracomunali, centri operativi comunali ed intercomunali, aree e strutture per l’assistenza alla popolazione, nel numero di 517 interventi, per uno stanziamento complessivo di euro 20.051.468,00, come riepilogato nell’allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che tali stanziamenti costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Preso atto che l’Agenzia regionale di protezione civile, in raccordo con le Province, sta effettuando con continuità attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere sopracitate, le cui risultanze sono le seguenti:

1. l'attuazione di una parte significativa dei programmi è stata completata o è in corso nel rispetto dei tempi e degli indirizzi di cui alle deliberazioni sopracitate; in particolare, n° 399 interventi pari al 73,6% del totale, per 14.757.968,00 euro, sono stati completati, mentre n° 95 interventi, pari al 20,7% del totale, per 4.158.500,00 euro, sono in corso di esecuzione;
2. per una parte degli interventi non risultano rispettati i tempi di attuazione previsti ed in particolare:
 - a) n. 22 interventi, pari al 5,5% del totale, per euro 1.100.000,00, non risultano iniziati o completati nei termini previsti dagli atti di programma sopracitati, essendovi comunque ancora le condizioni per la loro realizzazione (tabella allegata 2);
 - b) n. 1 intervento, pari allo 0,2% del totale, per 35.000,00 euro, non risulta avviato e non vi sono più le condizioni per la sua realizzazione; per tale intervento l'ente assegnatario rinuncia al finanziamento (tabella allegata 3);

Considerato che, per n. 2 interventi di cui alla lettera a) si è riscontrata la necessità di ridefinire tempi ma soprattutto tipologia di struttura finanziata a seguito dell'emergenza umanitaria nel territorio regionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, come da OPCM nn. 3924 del 18/02/2011 e 3933 del 13/04/2011;

Preso atto che, sulla base delle segnalazioni degli enti attuatori degli interventi e dei riscontri effettuati dall'Agenzia regionale di protezione civile in raccordo con le Province, le ragioni dei ritardi nella realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2, lettera a), sono da addebitarsi principalmente alle difficoltà degli enti nel concludere nei tempi previsti le procedure d'appalto, alla rigidità di gestione dei bilanci dovuta ai vincoli del patto di stabilità e, da ultimo, all'insorgere, con riferimento alle localizzazioni delle strutture, di problematiche di tipo urbanistico che hanno portato ad un allungamento dei tempi di realizzazione;

Preso atto altresì che gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente punto 2, lettera a), hanno manifestato esplicito interesse ad avviare e concludere gli interventi - ancorché in ritardo, per le ragioni sopraindicate, rispetto ai termini stabiliti a suo tempo dalla Giunta Regionale - e quindi a completare le opere finalizzate alla realizzazione della rete regionale delle strutture operative di Protezione Civile;

Preso atto che per n. 2 interventi, in accordo con gli Enti beneficiari dei finanziamenti, si è convenuto di modificare la struttura oggetto di finanziamento a fronte dell'emergenza umanitaria sopracitata;

Considerato che in data 01/04/2011 si è tenuto un incontro fra l' Assessore regionale alla "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile" e gli Assessori provinciali alla Protezione civile o loro delegati, per esaminare, anche in riferimento alle specifiche competenze assegnate alle Province dalla legge regionale n. 1/2005, gli esiti del monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di realizzazione delle strutture di cui alle deliberazioni citate, dal cui verbale risulta:

- una valutazione complessivamente positiva sullo stato di attuazione delle strutture che ha già consentito di migliorare la capacità di risposta alle emergenze del sistema regionale di Protezione Civile;
- la presa d'atto che, relativamente agli interventi di cui al precedente punto 2, lettera a), già programmati con gli atti deliberativi sopracitati, gli stessi risultano essere strategici per l'attuazione dei piani comunali e provinciali di emergenza e che pertanto risulta opportuno proporre alla Giunta la conferma dei finanziamenti assegnati con i predetti atti e la fissazione di nuovi termini per il completamento delle connesse attività tecnico-amministrative;
- la presa d'atto che per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente punto 2, lettera b), non ancora iniziati, si rende necessaria la revoca dei finanziamenti assegnati;

- la sussistenza sul territorio nazionale di una conclamata emergenza umanitaria derivante dai conflitti nati nei Paesi del Nord Africa e dal conseguente afflusso di cittadini di tali paesi e che a tal proposito in data 6 aprile 2011 si sarebbe tenuta una Conferenza Unificata Stato-Regioni;

Considerato che, in data 06 aprile 2011, in sede di cabina di regia della Conferenza Unificata il governo, le Regioni e gli Enti locali hanno siglato un'intesa che prevede l'attivazione delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'art. 20 del Testo unico delle disposizioni sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, adottato con D.Lgs. n. 286/1998;

Ritenuto pertanto opportuno, anche sulla base delle risultanze dell'incontro regionale sopracitato, di confermare i finanziamenti degli interventi di cui al precedente punto 2, lettera a), fissando nuovi termini per il completamento delle connesse attività tecnico-amministrative e modificando l'assetto tipologico di n. 2 finanziamenti di questi, così come dettagliatamente riportati nella tabella 2 allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di procedere alla revoca dei finanziamenti di cui al precedente punto 2, lettera b), dettagliati nella tabella 3 allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste:

- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013";
- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n.8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Richiamate:

- la L.R. 21 novembre 2001, n.40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedurali e di organizzazione per l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la quale l'Ing. Demetrio Egidi è stato nominato Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile;
- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006 "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, successivamente integrata e modificata con la deliberazione n.1121 del 21 luglio 2008;
- le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006; n.1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 19 dicembre 2008; n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008 e n. 2285/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile, come riepilogati nella allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare i finanziamenti assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale richiamate al precedente punto 1, ad eccezione del finanziamento di cui al successivo punto 4;
3. di fissare nuovi termini per l'avvio e la ultimazione degli interventi di cui al punto 2, lettera a), della premessa ed analiticamente dettagliati nell'allegata tabella 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di modificare la tipologia di n. 2 interventi di cui alla tabella 1 per le motivazioni espresse in premessa, legate sostanzialmente all'emergenza umanitaria in relazione a cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, ed in particolare:

ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	ATTO DI PROGRAMMA		
			N°	DEL	IMPORTO
Provincia	AA+SPA (Prima AA)	Reggio Emilia (RE)	DGR 2285	27/12/2010	40.000,00
Comune	AA+SPA (Prima CS)	San Giovanni in Persiceto (BO)	DGR 1387	14/07/2003	70.000,00

5. di revocare il finanziamento assegnato al Comune di Montecchio Emilia (RE) con la

deliberazione della Giunta regionale n. 747/2007 come specificato nel seguente prospetto:

ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	ATTO DI PROGRAMMA			ATTO DI IMPEGNO	
			N°	DE	IMPORTO	N°	DEL
Comune di Montecchio Emilia	SPA	Montecchio Emilia (RE)	DGR 747	29/05/2007	35.000,00	DD 5444	14/05/2008

6. di dare atto che ai provvedimenti contabili conseguenti alla revoca di cui al precedente punto 5) ed all'accertamento delle economie provvederà, con propri atti, il dirigente regionale competente;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



**Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile**

**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2010.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 1

**ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI
INTERVENTI FINANZIATI**




RIASSUNTO FINANZIARIO REGIONALE SUDDIVISO PER CATEGORIE

RIASSUNTO FINANZIARIO			
CATEGORIE	N. FINANZ.	IMPORTO	PERCENT.
Finanziamenti dal 2000 ad oggi	517	20.051.468,00	100,0%
Completati	399	14.757.968,00	73,6%
Non completati ed entro i termini dei relativi atti di programma	95	4.158.500,00	20,7%
Completati con saldo oltre i termini previsti dagli atti di programma	0	0,00	0,0%
Non completati con ridefinizione termini completamento e/o tipologia struttura per motivazioni validate	22	1.100.000,00	5,5%
Revocati	1	35.000,00	0,2%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE DI STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
(espressa in euro ed in punti percentuale sul totale)

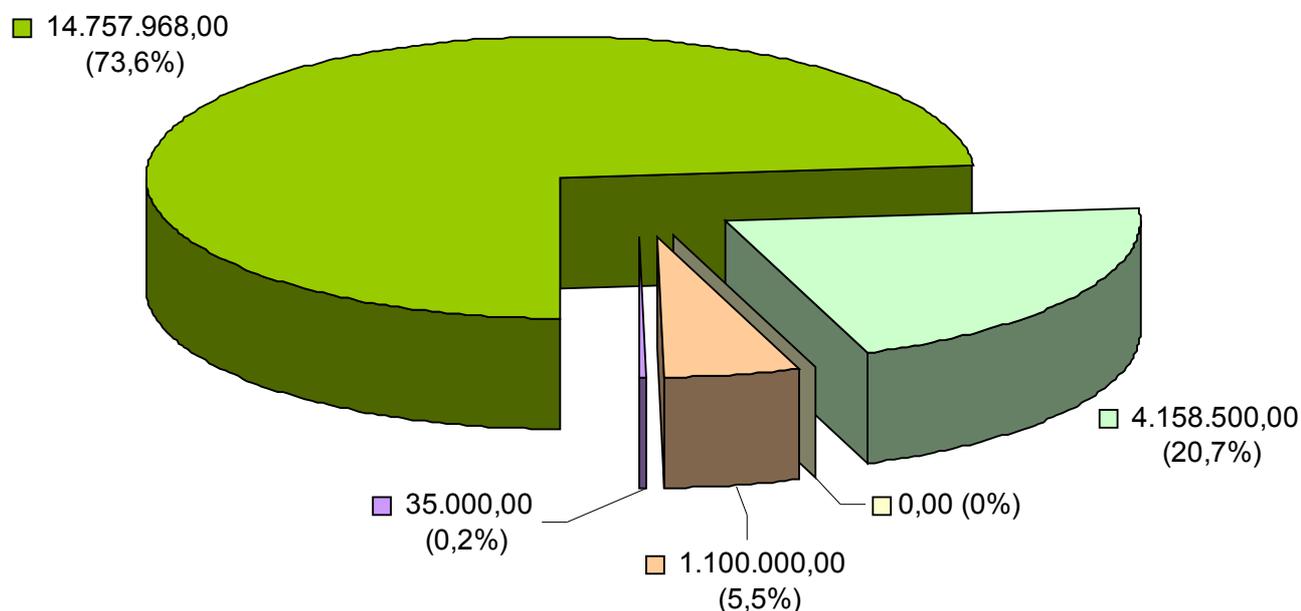

- Completati
- Non completati ed entro i termini dei relativi atti di programma
- Completati con saldo richiesto oltre i termini previsti dagli atti di programma
- Non completati con ridefinizione termini completamento e/o tipologia struttura per motivazioni validate
- Revocati



**Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile**

**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2010.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 2

**ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI
CON RIDEFINIZIONE TERMINI E/O
RIDEFINIZIONE TIPOLOGIA STRUTTURA**



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI CON RIDEFINIZIONE TERMINI
(evidenziati i finanziamenti per i quali è stata modificata la tipologia di struttura)

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALEZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
1	PR	Comune	CS	Borgo Val di Taro	60.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	15/10/2010	29/07/2012	01/04/2011	01/06/2011	Ritardi nell'aggiudicazione e nella consegna dei lavori. Già prorogato con DGR 1624/10.	
2	RE	Comune	COC	Albinea	15.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	01/04/2011	31/12/2011	Realizzazione in corso di ponte radio a copertura territori comunali di Albinea e Quattro Castella. Mai prorogato precedentemente.	
3	RE	Comunità Montana Appennino Reggiano	CS	Castelnovo ne' Monti	100.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	29/01/2011	29/07/2012	03/02/2011	29/08/2011	03/02/2012	Area di sedime della struttura non adeguata - rilocalizzazione della struttura in altro punto dell'area. Mai prorogato precedentemente.
4	RE	Comune	AA	Guastalla	52.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	01/04/2011	14/10/2011	Lavori affidati e modifiche progettuali. Ultimabili entro la data richiesta. Mai prorogato precedentemente.	
5	RE	Comune	AA	Montecchio Emilia	52.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	31/03/2011	29/07/2012	24/03/2011	31/06/2011	Ultimazione iter appalto. Già prorogato con DGR 1624/10.	



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
5	RE	Provincia	AA + SPA	Reggio Emilia	40.000,00	DGR 2285	27/12/2010	-	-	-	-	15/04/2011	-	-	Necessità di rinominare la AA in SPA derivante da emergenza umanitaria di cui all'OPCM3933/11.
6	MO	Comune	CS	Frassinoro	100.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	15/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella redazione della pratica antisismica; disagi per il cantiere invernale. Struttura un fase di ultimazione. Mai prorogato precedentemente.
7	MO	Provincia	SPA	Guiglia	35.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA
8	MO	Provincia	AA	Pievepelago	52.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA
9	MO	Provincia	SPA	Pievepelago	35.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA



**Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile**

PROGR.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
10	MO	Provincia	COC	Savignano sul Panaro	15.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA
11	BO	Comune	AA + SPA	San Giovanni in Persiceto	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	DGR 1387	14/07/2003	02/04/2011	02/04/2013	11/05/2011	02/10/2011		Valutazioni su progettazione definitiva e quanto resosi necessario a seguito emergenza umanitaria OPCM 3933/11. Già prorogato con DGR 1624/10.
12	BO	Comune	SPA	Sasso Marconi	35.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DGR 2245	21/12/2007	27/12/2008	27/12/2010	23/12/2010		30/06/2011	Mancata disponibilità di alcuni locali. Mai prorogato precedentemente.
13	BO	Comune	CS	San Giovanni in Persiceto	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	DGR 1387	14/07/2003	02/04/2011	02/04/2013	01/04/2011	02/10/2011		Valutazioni in merito alla progettazione definitiva e ritardi nella aggiudicazione delle opere. Già prorogato con DGR 1624/10.
14	FE	Provincia	AA	Codigoro	52.000,00	DGR 1661	29/07/2004	DD 5300	13/04/2006	30/06/2011	13/12/2012	01/04/2011	31/12/2011	31/12/2012	Difficoltà nell'individuazione dell'area e reperimento fondi. Già prorogato con DGR 1624/10.
PROGR.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE



**Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile**

ESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	RICHIESTA ACCONTO		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	DEL	N°		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
15	FE	Comune	AA	Copparo	52.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	28/10/2010	30/05/2011	Lavori consegnati. Richiesta acconto tardiva. Mai prorogato precedentemente.	
16	FE	Comune	SPA	Copparo	35.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	28/10/2010	30/05/2011	Lavori consegnati. Richiesta acconto tardiva. Mai prorogato precedentemente.	
17	RA	Comune	CS	Bagnacavallo	18.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	14/05/2011	24/03/2011	31/12/2011	Progettato e da appaltarsi. Ultimazione prevista entro l'anno. Già prorogato con DGR 1624/10.	
18					100.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011				
19	FC	Comune	COC	Borghi	15.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	31/12/2010	13/08/2011	01/04/2011	31/12/2011	Completamento edificio polifunzionale contenente il COC. Lavori in via di ultimazione. Già prorogato con DGR 1624/10.	
20	FC	Comune	COC	Forlimpopoli	15.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	01/04/2011	31/12/2011	Attesa per l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Acquisizioni previste comunque entro l'anno. Mai prorogato precedentemente.	
PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	DEL	N°		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

21	FC	Comune	AA	Premilcuore	52.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	10/01/2011	31/12/2011	Inizio lavori tardiva a seguito di modifiche progettuali (spostamento traliccio ENEL). Lavori in realizzazione. Mai prorogato precedentemente.
22	RN	Comune	CS	Santarcangelo di Romagna	100.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	18/11/2010	31/12/2013	Mancata realizzazione per rispetto obiettivi programmatici patto di stabilità. Mai prorogato precedentemente.
TOTALE €					1.100.000,00									

LEGENDA:

CUP: Centro Unificato Provinciale
CS: Centro sovracomunale

COM: Centro Operativo Misto
COC: Centro Operativo Comunale

AA: Area di Ammassamento
CR: Centro di Ricovero, successivamente ridefinito in SPA (Struttura di Prima Assistenza)



**Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile**

**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2010.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 3

**ELENCO INTERVENTI OGGETTO DI
REVOCA**



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

ELENCO INTERVENTI OGGETTO DI REVOCA

RESS.PROG	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUTTURA	IN COMUNE DI	ATTO DI PROGRAMMA			ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI PER:		COMUNICAZIONE RINUNCIA AL FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI		
					N°	DEL	IMPORTO	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		IMPEGNO	CAPITOLO	ANNUALITA' FONFO REGIONALE
1	RE	Comune	SPA	Montecchio Emilia	DGR 747	29/05/2007	35.000,00	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	24/03/2011	87	U23004	2008
TOTALE €				35.000,00											

LEGENDA:

CUP: Centro Unificato Provinciale
CS: Centro sovracomunale

COM: Centro Operativo Misto
COC: Centro Operativo Comunale

AA: Area di Ammassamento
CR: Centro di Ricovero, successivamente ridefinito in SPA (Struttura di Prima Assistenza)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Demetrio Egidi, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/809

data 25/05/2011

IN FEDE

Demetrio Egidi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/809

data 25/05/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
